

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS		Modalidade		Empreendimento				N ° BM			
		Processo Licitatório Nº 052/2024		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.				1			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						Data da Emissão			
		Contratada WS CONSTRUTORA LTDA.						Início da Obra 27/08/2024		Término da Obra 27/08/2025	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		Processo nº 052/2024									
Localização		Objetivo: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE									
ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.		Valor acumulado		Esta Medição			Saldo de Contrato		Período de		
		R\$ 39.828,95	R\$	39.828,95	R\$	557.171,05					
		Valor do Contrato		Valor do Concedente			Valor do Proponente		30/09/2024 a 24/01/2025		
Data do Contrato 27/08/2024		R\$ 597.000,00									
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO. PESQUEIRA/PE				596.969,50					-	R\$ 39.828,95
1	LADEIRA DA VEIA BIDE				66.341,26					-	R\$ 3.036,77
1.1	placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	8	335,11	2.680,88			-	-	-	-
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	m²	600	1,23	738,00			600,00	-	-	R\$ 738,00
1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	600	87,10	52.260,00			-	-	-	-
1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	M	218	48,91	10.662,38			47,00	-	-	R\$ 2.298,77
2	LADEIRA DE VAL DE ZE PRETO				72.743,04					-	R\$ 36.792,18
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	m²	684	1,23	841,32			684,00	-	-	R\$ 841,32
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	684	87,10	59.576,40			342,00	-	-	R\$ 29.788,20
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	M	252	48,91	12.325,32			126,00	-	-	R\$ 6.162,66
3	LADEIRA PERTO DO CAMPO				31.976,92					-	-
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	m²	300	1,23	369,00			-	-	-	-
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	300	87,1	26130			-	-	-	-
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	M	112	48,91	5477,92			-	-	-	-

4	LADEIRA DE GEU				63660,38			-	-	-
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	m²	600	1,23	738			-	-	-
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	600	87,1	52260			-	-	-
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	M	218	48,91	10662,38			-	-	-
5	LADEIRA BREJINHO 01				44532,92			-	-	-
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	m²	420	1,23	516,6			-	-	-
5.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	420	87,1	36562			-	-	-
5.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	M	152	48,91	7434,32			-	-	-
6	LADEIRA REGIO LIDERANÇA 1 PARTE				63660,38			-	-	-
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	m²	600	1,23	738			-	-	-
6.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	600	87,1	52260			-	-	-
6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	M	218	48,91	10662,38			-	-	-
7	LADEIRA REGIO LIDERANÇA 2 PARTE				63660,38			-	-	-
7.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	m²	600	1,23	738			-	-	-
7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	600	87,1	52260			-	-	-
7.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	M	218	48,91	10662,38			-	-	-
8	LADEIRA DE REGIO LIDERANÇA 3 PARTE				63660,38			-	-	-
8.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	m²	600	1,23	738			-	-	-
8.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	600	87,1	52260			-	-	-
8.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	M	218	48,91	10662,38			-	-	-


9	LADEIRA DE JOAO MOCO				31976,92				-	-	-
9.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	m²	300	1,23	369			-	-	-	-
9.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	300	87,1	26130			-	-	-	-
9.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	M	112	48,91	5477,92			-	-	-	-
10	RUA SEM PROJETADA				94756,92				-	-	-
10.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	m²	900	1,23	1107			-	-	-	-
10.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	900	87,1	78390			-	-	-	-
10.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	M	312	48,91	15259,92			-	-	-	-
VALOR DA MEDIÇÃO: (TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) R\$ 39.828,95											


 CLÁUDIA BETHÂNIA BEZERRA CORREIA
 SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

César Augusto P. Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 182290671-7



 FISCAL DO CONTRATO

Fábio Júnio da Silva Correia
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 059828


 WS CONSTRUTORA
 CONTRATADA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 001

Pavimentação em paralelepípedos em acessos de aldeias indígenas e no distrito Cacimbão no município de Pesqueira-PE.
CONTRATO Nº 0271/2024/PMP; P.L.:052/2024/PMP

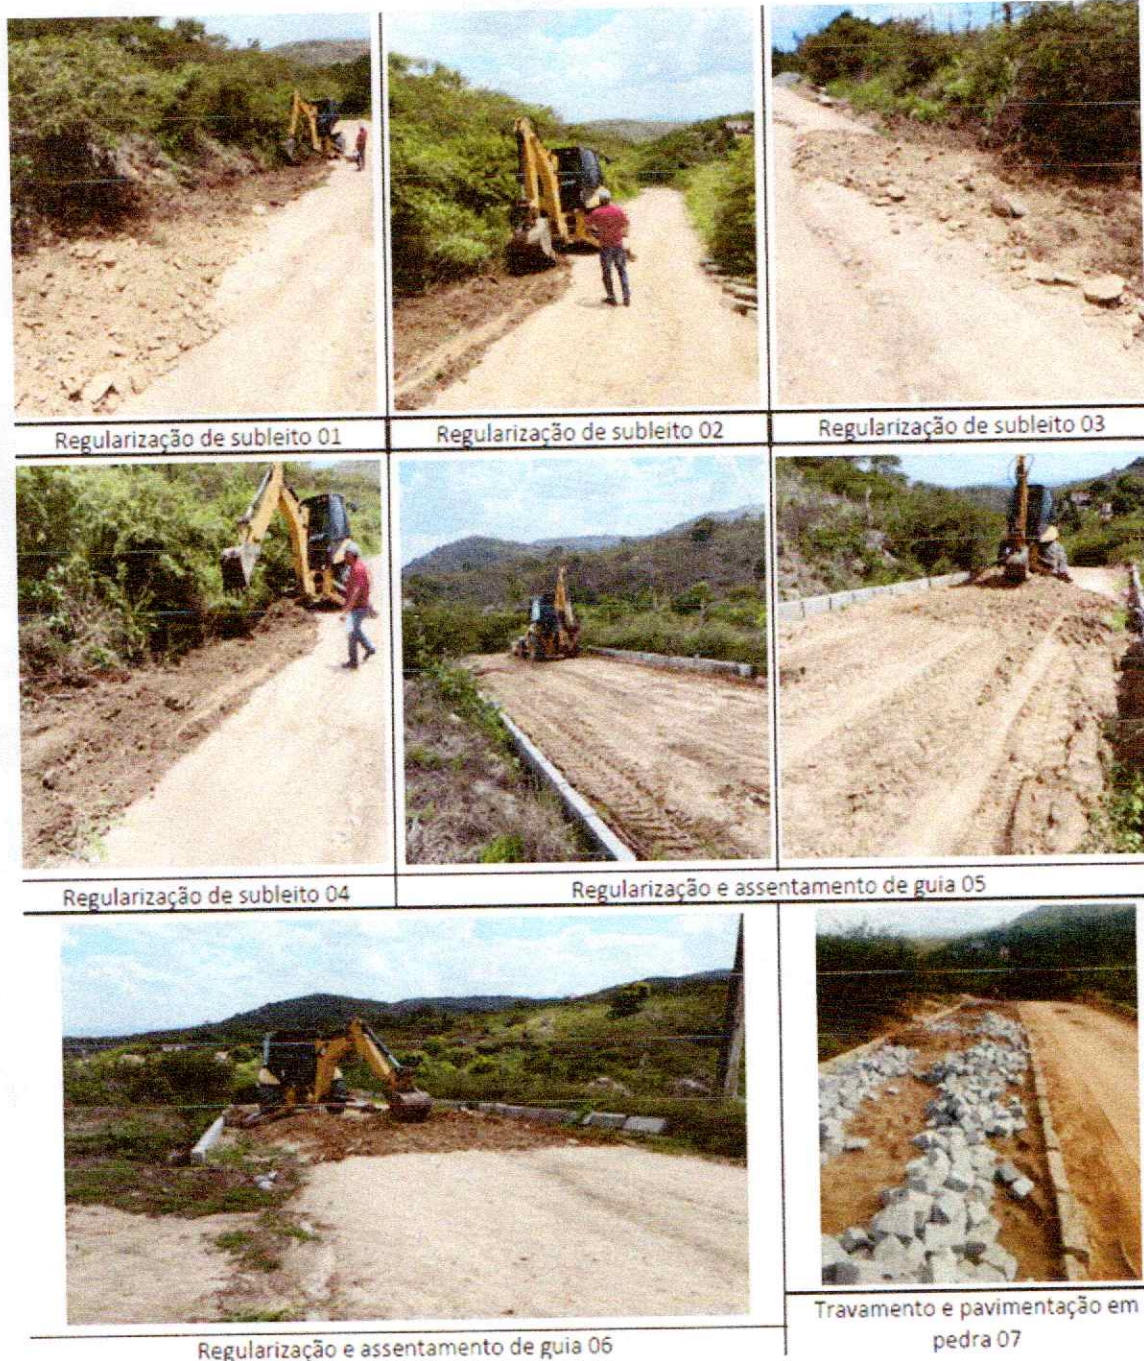

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS




PAVIMENTAÇÃO 08



PAVIMENTAÇÃO 09



PAVIMENTAÇÃO 10

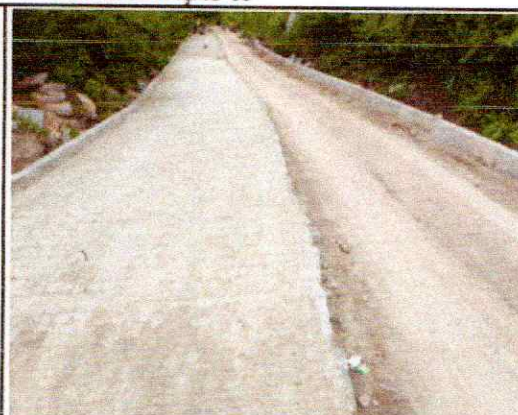


PAVIMENTAÇÃO 11



LAD.VELHA BIDE, MEIO FIO



LAD.VELHA BIDE, MEIO FIO

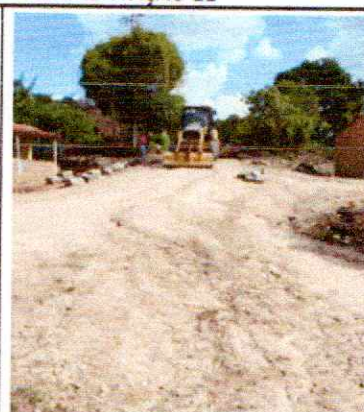

LAD.VELHA BIDE, REGULARIZAÇÃO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS



LAD. VELHA BIDE REGULARIZAÇÃO DE SOLO



LAD. VELHA BIDE REGULARIZAÇÃO DE SOLO

